



Comune di
LUNGAVILLA
Provincia di Pavia

**OPERE DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PER LA REALIZZAZIONE DELLE MENSE
SCOLASTICHE DI CUI AL PNRR**

Via Dionigi Massazza n° 57/a

**OPERE ARCHITETTONICHE
Progetto Definitivo-Esecutivo**

Fascicolo n. **5**

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DA
ESEGUIRE**

SINDACO
Carla Beccaria

PROGETTISTI
dott. arch. Mario Mossolani
dott.ing. Marcello Mossolani

SEGRETARIO
dott. Roberto Bariani

COLLABORATORI
geom. Mauro Scano

TECNICO COMUNALE
dott. arch. Clara Nobile

MI STUDIO
MI MOSSOLANI

Via della Pace 14 - 27045 Casteggio (Pavia) – Telefono: 0383/890096 - E-mail: info@studiomossolani.it




COMUNE DI LUNGAVILLA - Provincia di Pavia

OPERE DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE DI CUI AL PNRR

OPERE ARCHITETTONICHE

Diagramma di Gannt

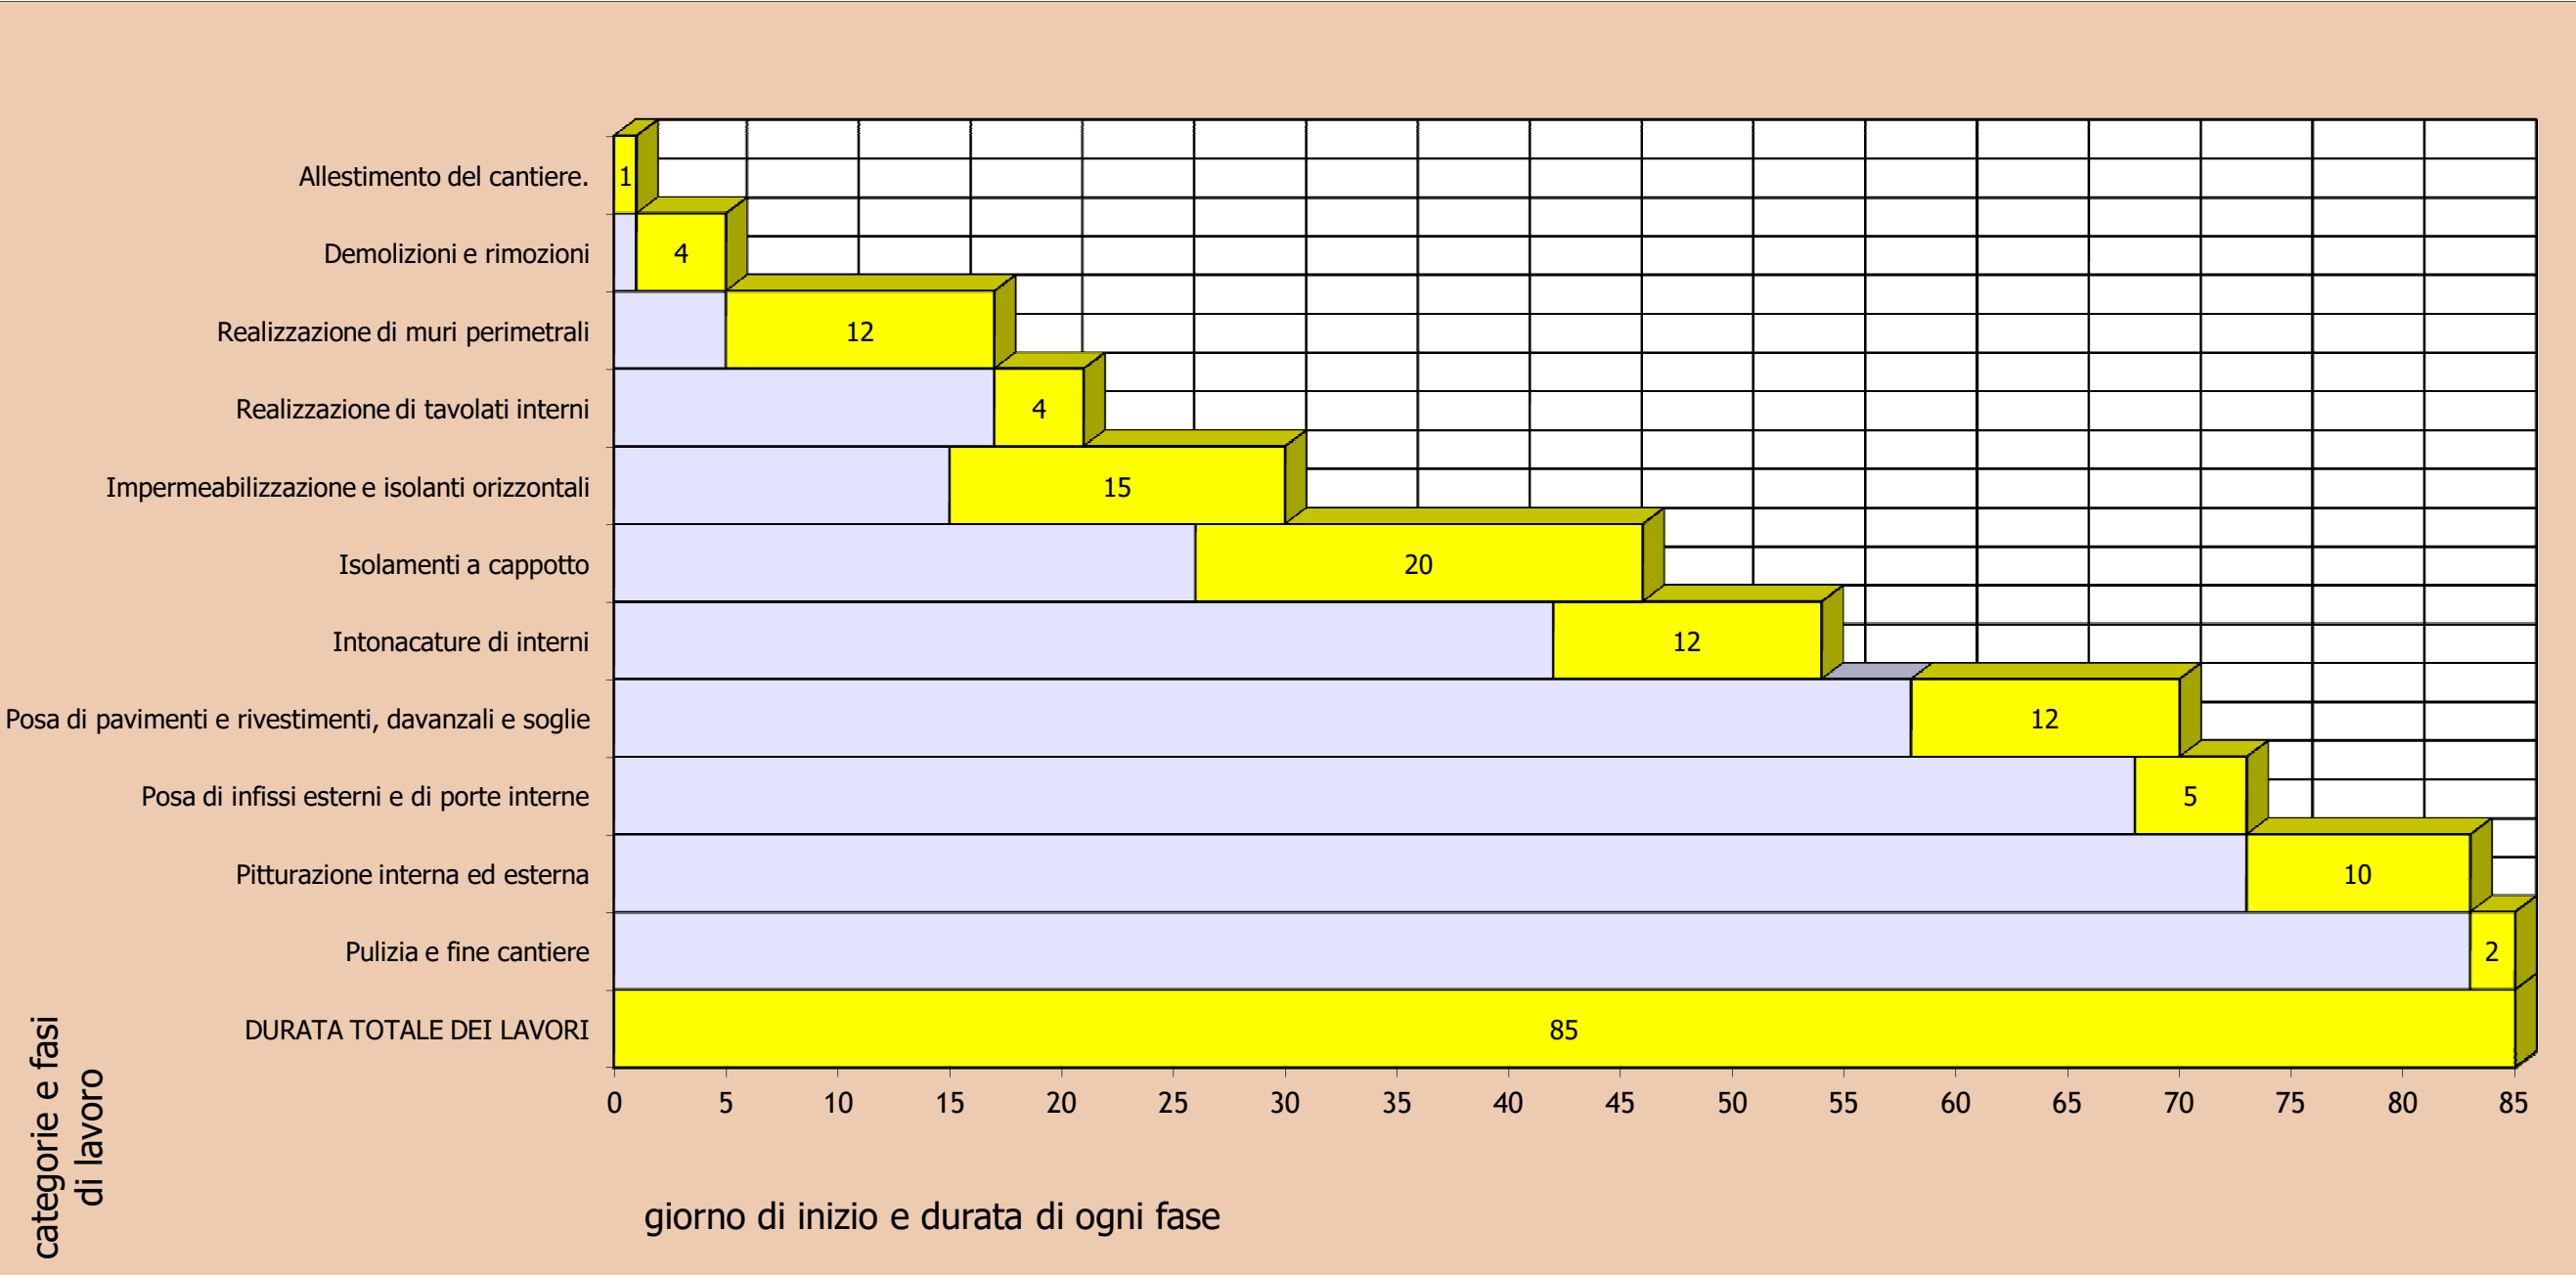



COMUNE DI LUNGAVILLA - Provincia di Pavia

OPERE DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE DI CUI AL PNRR

OPERE ARCHITETTONICHE

Singole fasi lavorative

date ipotetiche

N. FASE	DESCRIZIONE DELLA FASE LAVORATIVA	durata gg.	inizio	FINE
1	Allestimento del cantiere.	1	1/1/24	2/1/24
2	Demolizioni e rimozioni	4	2/1/24	6/1/24
3	Realizzazione di muri perimetrali	12	6/1/24	18/1/24
4	Realizzazione di tavolati interni	4	18/1/24	22/1/24
5	Impermeabilizzazione e isolanti orizzontali	15	16/1/24	31/1/24
6	Isolamenti a cappotto	20	27/1/24	16/2/24
7	Intonacature di interni	12	12/2/24	24/2/24
8	Reti smaltimento e opere esterne	8	22/2/24	1/3/24
10	Posa di pavimenti e rivestimenti, davanzali e soglie	12	28/2/24	11/3/24
11	Posa di infissi esterni e di porte interne	5	9/3/24	14/3/24
12	Pitturazione interna ed esterna	10	14/3/24	24/3/24
13	Pulizia e fine cantiere	2	24/3/24	26/3/24
DURATA TOTALE DEI LAVORI		giorni	85	
